

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Agosto / 2022**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE INVERSION Y MODERNIZACION PARA EL SECTOR JUSTICIA**

Organismo ejecutor: **Instituto de la Defensa Pública Penal**

Número de Préstamo	BCIE-2181	Fecha de última actualización	09/09/2022
Código Presupuestario	5204010071	Fecha del Decreto	20/05/2020
Organismo Financiero	BCIE	Fecha de Suscripción	20/05/2020
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	20/05/2020
Monto contratado	300,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	28/12/2020
Monto contratado Entidad ejecutora	20,000,000.00	Fecha de cierre actual	20/05/2026
Monto Entidad Ejecutora Dolares	20,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	154,764,000.00	Plazo de ejecución	29.00%
Desembolsos realizados a la fecha	714,101.00 3.57%	Monto por desembolsar USD\$	19,285,899.00 96.43%

**Gráfica de Ejecución**

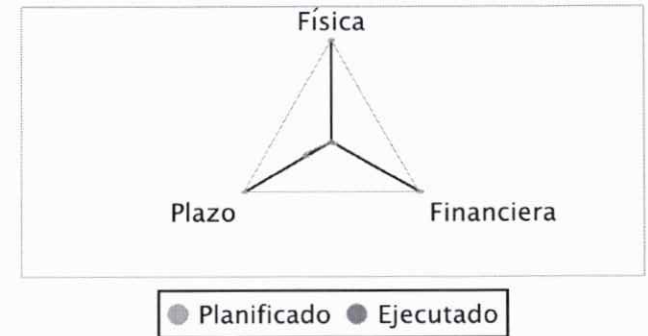

Tipo de cambio: 7.7382 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2022		Total	
Asignación Presupuestaria anual	53,400,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	18,400,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	1,768,238.65	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	30.61% / 76.44%		
Porcentaje de Ejecución	9.61%	Próximo desembolso del mes	Noviembre	Plazo de ejecucion Actual	38.00%		
		Presupuesto planificado próximo	7,691,890.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	6.9424		



## Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Preinversión</b>									
Estudio de Pre inversion	Unidad	6		6		0		12	
<b>Componente: Administración</b>									
Personal Contratado UEE	Unidad	6	3	0		0		6	3
Adquisición Mobiliario	Unidad	0		0		0		0	
Adquisicion Vehiculos UEE	Unidad	0		1		0		1	
Adquisicion Equipo Computo	Unidad	1		0		0		1	
<b>Componente: Supervisión</b>									
Supervisores Contratados	Unidad	0		0		3		3	
<b>Componente: Comisión de Seguimiento y Administración</b>									
Comision Pagada	Unidad	0		0	0	0		0	0
<b>Componente: Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>									
Construccion de Sedes Departamentales	Unidad	0		0		3		3	
Construccion de Sedes Municipales	Unidad	0		0		2		2	



Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Construccion Oficina Defensoria Indigena	Unidad	0		0		0		0	
Construccion Edificio Sede Central	Unidad	0		0		0		0	





## Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Administración</b>											
<b>Personal Contratado UEE</b>											
Asistente Presupuestario (CC-02)	Comparación de Precios o Calificaciones	10/02/2022	01/02/2022	10/02/2022	03/02/2022	15/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	14/02/2022	08/03/2022	15/03/2022
Asistente de Infraestructura (CC-03)	Comparación de Precios o Calificaciones	10/02/2022	01/02/2022	10/02/2022	03/02/2022	15/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	14/02/2022	08/03/2022	15/03/2022
Asistente de Adquisiciones (CC-05)	Comparación de Precios o Calificaciones	03/03/2022	22/04/2022	03/03/2022	04/05/2022	08/03/2022	16/05/2022	08/03/2022		03/04/2022	
Consultor Jurídico (CC-06)	Comparación de Precios o Calificaciones	10/02/2022	01/02/2022	10/02/2022	03/02/2022	15/02/2022	10/02/2022	15/02/2022	14/02/2022	08/03/2022	15/03/2022
Asistente Contable (CC-01)	Comparación de Precios o Calificaciones	03/03/2022	22/04/2022	03/03/2022		08/03/2022		08/03/2022		15/03/2022	
<b>Adquisición Vehiculos UEE</b>											
Adquisición de 4 Vehículos para uso de la Unidad Ejecutora (LPN-01)	Licitación o Concurso Público Nacional	01/03/2022	02/03/2022	01/03/2022	02/03/2022	31/03/2022		31/03/2022		16/05/2022	
<b>Adquisición Equipo Computo</b>											
Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora (CP-03)	Comparación de Precios o Calificaciones	07/03/2022		07/03/2022		17/03/2022		17/03/2022		29/04/2022	
<b>Útiles y suministros de oficina</b>											
Adquisición de cartuchos de tóner para impresora multifuncional para la Unidad Ejecutora (CP-04)	Comparación de Precios o Calificaciones	25/02/2022		25/02/2022		04/03/2022		04/03/2022		22/03/2022	
Adquisición de encuadernadora manual, cubiertas lisas y anillos plásticos para la Unidad Ejecutora (CP-05)	Comparación de Precios o Calificaciones	25/02/2022		25/02/2022		04/03/2022		04/03/2022		22/03/2022	
<b>Supervisión</b>											
<b>Supervisores Contratados</b>											



Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Contratación de Ingeniero Supervisor para la Construcción de la Sede Central desde el punto de vista de estructural, calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo. (CC-07)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/05/2023		01/05/2023		06/05/2023		06/05/2023		13/06/2023	
Contratación de Arquitecto Supervisor de la construcción de edificio de la sede central desde el punto de vista arquitectónico, diseño propiamente dicho y acabados finales. (CC-08)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/05/2023		01/05/2023		06/05/2023		06/05/2023		13/06/2023	
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Escuintla (CC-09)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/11/2022		01/11/2022		06/11/2022		06/11/2022		01/12/2022	
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Quetzaltenango (CC-10)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/11/2022		01/11/2022		06/11/2022		06/11/2022		01/12/2022	
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Jutiapa (CC-11)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/11/2022		01/11/2022		06/11/2022		06/11/2022		01/12/2022	
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Guastatoya, El Progreso (CC-12)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/03/2023		01/03/2023		06/03/2023		06/03/2023		31/03/2023	
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Coatepeque (CC-13)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/03/2023		01/03/2023		06/03/2023		06/03/2023		31/03/2023	
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de San Marcos (CC-14)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/03/2023		01/03/2023		06/03/2023		06/03/2023		31/03/2023	
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Huehuetenango (CC-15)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/03/2023		01/03/2023		06/03/2023		06/03/2023		31/03/2023	
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Chimaltenango (CC-16)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/03/2023		01/03/2023		06/03/2023		06/03/2023		31/03/2023	
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Jalapa (CC-17)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/03/2023		01/03/2023		06/03/2023		06/03/2023		31/03/2023	
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Cobán (CC-18)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/03/2023		01/03/2023		06/03/2023		06/03/2023		31/03/2023	





Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Flores (CC-19)	Comparación de Precios o Calificaciones	01/03/2023		01/03/2023		06/03/2023		06/03/2023		31/03/2023	
<b>Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>											
<b>Construcción de Sedes Departamentales</b>											
Construcción de 3 oficinas de Sedes Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango) (LPI-01)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/12/2022		01/12/2022		16/01/2023		16/01/2023		23/03/2023	
<b>Equipamiento de Sedes Departamentales</b>											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 3 Oficinas Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango) (LPI-04)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/08/2023		01/08/2023		15/09/2023		15/09/2023		09/10/2023	
<b>Construcción de Sedes Municipales</b>											
Construcción de 8 oficinas de Sedes Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Cobán y Flores) (LPI-02)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/04/2023		01/04/2023		17/05/2023		17/05/2023		22/07/2023	
<b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>											
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 8 Oficinas Municipales (Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Cobán y Flores) (LPN-03)	Licitación o Concurso Público Nacional	01/11/2023		01/11/2023		01/12/2023		01/12/2023		09/01/2024	
<b>Construcción Edificio Sede Central</b>											
Construcción de edificio de 9 niveles Sede Central IDPP (LPI-03)	Licitación o Concurso Público Internacional	01/06/2023		01/06/2023		17/07/2023		17/07/2023		21/09/2023	
<b>Equipamiento de Edificio Sede Central</b>											
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-05)	Licitación o Concurso Público Internacional	15/09/2025		15/09/2025		30/10/2025		30/10/2025		21/11/2025	
<b>Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central</b>											
Mejoramiento de las instalaciones actuales del edificio IDPP Central (LPN-02)	Licitación o Concurso Público Nacional	01/09/2022		01/09/2022		07/10/2022		07/10/2022		28/10/2022	



## Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Preinversión</b>													
<b>Estudio de Pre inversión</b>													
Contratación de estudios de 3 de topografía, 3 de Suelos 3 de Diseño y Estructura y 3 de Socio Ambiental para los Departamentos de Escuintla, Quetzaltenango y Jutiapa (CPN-07)	0.00	0.00	0.00	277,920.00	555,840.00	92,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,400.00
Contratación de estudios de 8 de topografía, 8 de Suelos 8 de Diseño y Estructura y 8 de Socio Ambiental para los Municipios de Guastatoya El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa Cobán y Flores. (CPN-08)	0.00	0.00	0.00	0.00	817,548.00	1,635,096.00	272,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,160.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	277,920.00	1,373,388.00	1,727,736.00	272,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651,560.00
<b>Administración</b>													
<b>Personal Contratado UEE</b>													
Asistente de PEP-POA-SNIP (CPN-04)	12,733.79	12,733.79	12,733.79	12,733.79	12,733.79	12,733.79	12,733.79	12,733.79	12,733.79	12,733.79	12,733.79	12,733.82	152,805.51
Asistente Presupuestario (CC-02)	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	110,700.00
Asistente de Infraestructura (CC-03)	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	114,750.00
Asistente de Adquisiciones (CC-05)	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	110,700.00
Consultor Jurídico (CC-06)	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	114,750.00





Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Asistente Contable (CC-01)	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	110,700.00
<b>Adquisicion Vehiculos UEE</b>													
Adquisición de 4 Vehículos para uso de la Unidad Ejecutora (LPN-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,598.06	0.00	0.00	0.00	885,598.06
<b>Adquisicion Equipo Computo</b>													
Adquisición de Equipo de Computo de la Unidad Ejecutora (CP-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,237.25
<b>Útiles y suministros de oficina</b>													
Adquisición de cartuchos de tóner para impresora multifuncional para la Unidad Ejecutora (CP-04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,229.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,229.73
Adquisición de encuadernadora manual cubiertas lisas y anillos plásticos para la Unidad Ejecutora (CP-05)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,454.02
<b>Total componente</b>	12,733.79	12,733.79	12,733.79	76,133.76	75,133.79	426,054.76	75,133.79	76,133.78	960,731.85	76,133.78	75,133.79	75,133.82	1,949,824.57
<b>Supervisión</b>													
<b>Supervisores Contratados</b>													
Contratación de Ingeniero Supervisor para la Construcción de la Sede Central desde el punto de vista de estructural, calidad de materiales y metodología de trabajo, así como tiempos de cronograma de trabajo (CC-07)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Arquitecto Supervisor de la construcción de edificio de la sede central desde el punto de vista arquitectónico, diseño propiamente dicho y acabados finales. (CC-08)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Escuintla (CC-09)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Quetzaltenango (CC-10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Departamental de Jutiapa (CC-11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Guastatoya, El Progreso (CC-12)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Coatepeque (CC-13)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de San Marcos (CC-14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Huehuetenango (CC-15)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Chimaltenango (CC-16)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Jalapa (CC-17)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción de la Oficina Municipal de Cobán (CC-18)													
Contratación de Ingeniero/Arquitecto Supervisor para la Construcción de la Oficina Municipal de Flores (CC-19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
<b>Inversión en Infraestructura y Equipamiento</b>													
<b>Construcción de Sedes Departamentales</b>													
Construcción de 3 oficinas de Sedes Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango) (LPI-01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Equipamiento de Sedes Departamentales</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 3 Oficinas Departamentales (Escuintla, Jutiapa y Quetzaltenango) (LPI-04)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Construcción de Sedes Municipales</b>													
Construcción de 8 oficinas de Sedes Municipales (Guastatoya, El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Cobán y Flores) (LPI-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Equipamiento de Sedes Municipales</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo para 8 Oficinas Municipales (Guastatoya, El Progreso, Coatepeque, San Marcos, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa, Cobán y Flores) (LPN-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Construcción Edificio Sede Central</b>													






Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Construcción de edificio de 9 niveles Sede Central IDPP (LPI-03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Equipamiento de Edificio Sede Central</b>													
Adquisición de Mobiliario y Equipo Sede Central (LPI-05)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Mejoramiento de Edificio Actual de Sede Central</b>													
Mejoramiento de las instalaciones actuales del edificio IDPP Central (LPN-02)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
<b>Total componente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
<b>Total</b>	12,733.79	12,733.79	12,733.79	353,053.79	1,449,521.79	2,162,790.79	347,649.79	75,133.79	990,731.99	75,133.79	75,133.79	250,133.82	5,776,484.57



### Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

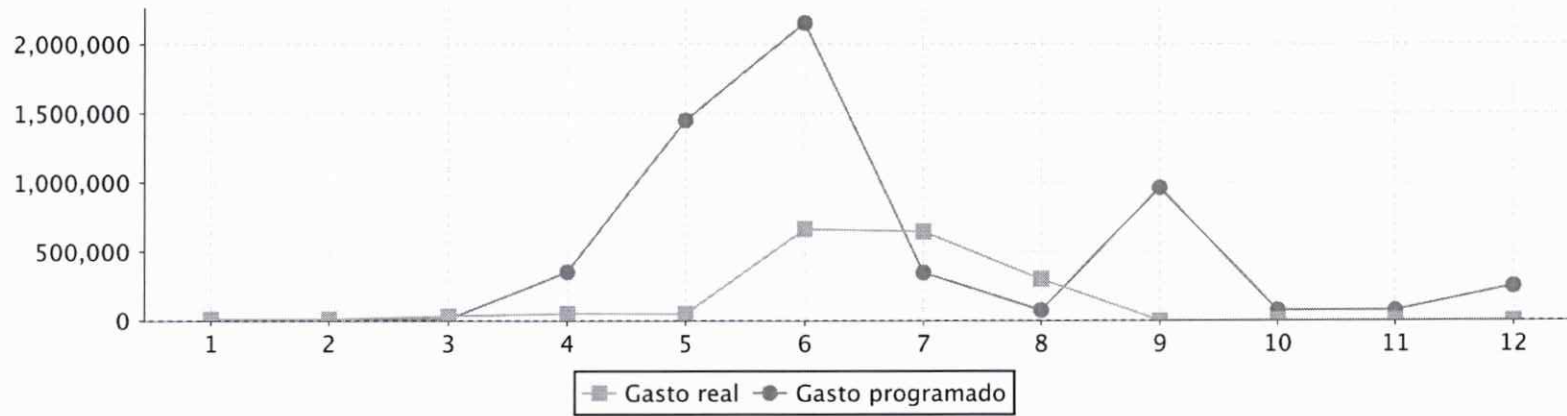

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	12,733.79	12,733.79	33,278.17	52,466.24	50,197.04	661,998.24	644,698.94	300,132.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	12,733.79	12,733.79	12,733.79	353,053.79	1,448,521.79	2,152,790.79	347,649.79	75,133.79	960,731.85	75,133.79	75,133.79	250,133.82
<b>Total Gasto real</b>												1,768,238.65
<b>Total Gasto programado</b>												5,776,484.57



## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691,890.00	0.00
<b>Realizado</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691,890.00	0.00






## Observaciones / Desafíos


Contratación de estudios de: Topografía 1, Suelos 1, Diseño y Estructura 1, Socio Ambiental 1. (CPI-01) adjudicado, contrato firmado.  
Pago del Producto 1, correspondiente al 30% por valor de Q591,345.00

## Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Elder Antonio González Colocho

  
Lic. Elder Antonio González Colocho  
Asistente PEP-POA SNIP  
IDPP - UEE - BCIE 2181  
Guatemala, Guatemala 007

Aprobado por: (nombre y firma) Ing. Juan Carlos Linares Cruz

  
Ing. Juan Carlos Linares  
Coordinador de la Unidad  
IDPP - UEE - BCIE 2181

Visto Bueno por: (nombre y firma) Msc. Edgar David Contreras Montoya

  
Msc. Edgar David Contreras Montoya  
Director de la División  
Administrativa Financiera  
Instituto de la Defensa Pública Penal

Fecha de actualización 9/9/2022 - 9:33 AM

